

東川口保育園移転改築事業 経過報告


1 設計概要

		設計（案）	現在
構造		鉄筋コンクリート造	鉄筋コンクリート造
階数		一部4階建て	2階建て
認可定員		90人	100人(現員80人)
延床面積		1,178㎡	1,006㎡
居室等	乳児室	22㎡	20㎡
	ほふく室	52㎡	58㎡
	保育室	4部屋・156㎡	6部屋・197㎡
	遊戯室	159㎡	173㎡
	事務室	50㎡	44㎡
	調理室	67㎡	71㎡
屋外遊戯場		525㎡	2,100㎡
その他		エレベーター・多目的トイレ	

2 水害対策

- (1) 園舎の高床化 … 1Fを駐車場にして保育室は2F～3Fに配置
 (2) 電気室の上層階設置 … 電気室を浸水リスクのない4階に設置
 (3) 玄関への止水板設置 … 浸水リスクのある1F職員玄関に止水板を設置

【階高／想定浸水深の比較イメージ】

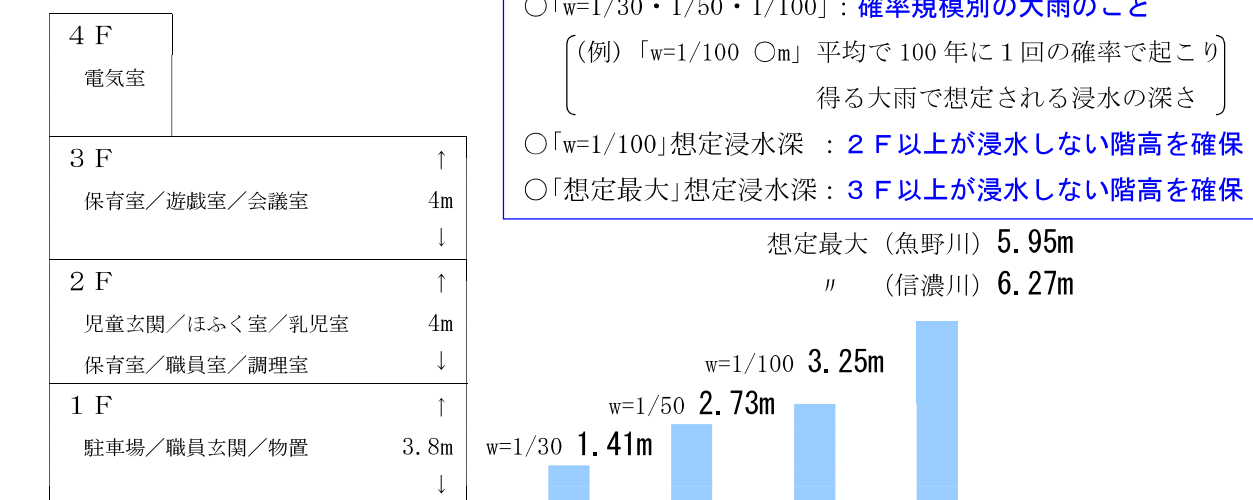

3 今後のスケジュール（予定）

- 令和5年 3月 設計完了、工事費積算調整
 9月 市議会（契約議決）、工事開始
 令和6年12月 工事完了、引越作業
 令和7年 1月 新園舎開園
